מזהה	שם פעילות	פעילויות קדם	משך	התחלה	סיום
1	ביח צפת פט סיטי		days 270	רבי' 15/02/17	שלש' 27/02/18
2	עבודות הכנה		days 31	רבי' 15/02/17	רבי' 29/03/17
3	התארגנות		days 16	רבי' 15/02/17	רבי' 08/03/17
4	ישיבת התנעה		days 0	רבי' 15/02/17	רבי' 15/02/17
5	קבלת צו התחלת עבודה		days 0	רבי' 01/03/17	רבי' 01/03/17
6	הגשת תוכנית/מפה התארגנות אתר	4			
7	אישור מפת התארגנות אתר	6			
8	מיקום מכלות - מכולת משרד מהנדס /מנה"ע מכולת מפקח,	7			
9	גידור אתר	7			
10	אישור שלט אתר לפני ביצוע ע"י הפיקוח	7			
11	הכנת שלט ומיקום שלט באתר	4			
12	חיבור תקשורת לאתר - קו טלפון,מודם מחשב	7			
13	אישור בודק חשמל לחיבורי משרדי אתר ולוחות זמניים	12			
14	אישורי צוות ניהול		days 17	רבי' 15/02/17	חמש' 09/03/17
15	אישור מנהל פרויקט	4			
16	אישור מנה"ע	5			
17	אישור תוכנית בטיחות לאתר	5			
18	אישורים ולוחות זמנים		days 31	רבי' 15/02/17	רבי' 29/03/17
89	עבודות בצוע		days 220	רבי' 15/02/17	שלש' 19/12/17
90	עבודות פנים		days 210	רבי' 15/02/17	שלש' 05/12/17
91	הריסה ופרויקים		days 26	רבי' 01/03/17	רבי' 05/04/17
92	הריסת מחיצות וגלריה	5			
93	פרוק אבנים משתלבות וחשיפת בטון רצוף	92הה	□ª□d □ 2		
94	פרוק מערכות	92			
95	חפירה ו/או חציבה בשטח	94			
96	מצע סוג א' מורטב ומהדק	95			
97	עבודות בטונים וקונסטרוקציה		days 35	ראש' 26/03/17	חמש' 11/05/17
98	יציקת רצפה צפה ע"ג שכבות מצעים	96			
99	עבודות בטון - מרצפים ורצפות.	98			
100	עבודות בניה	99			

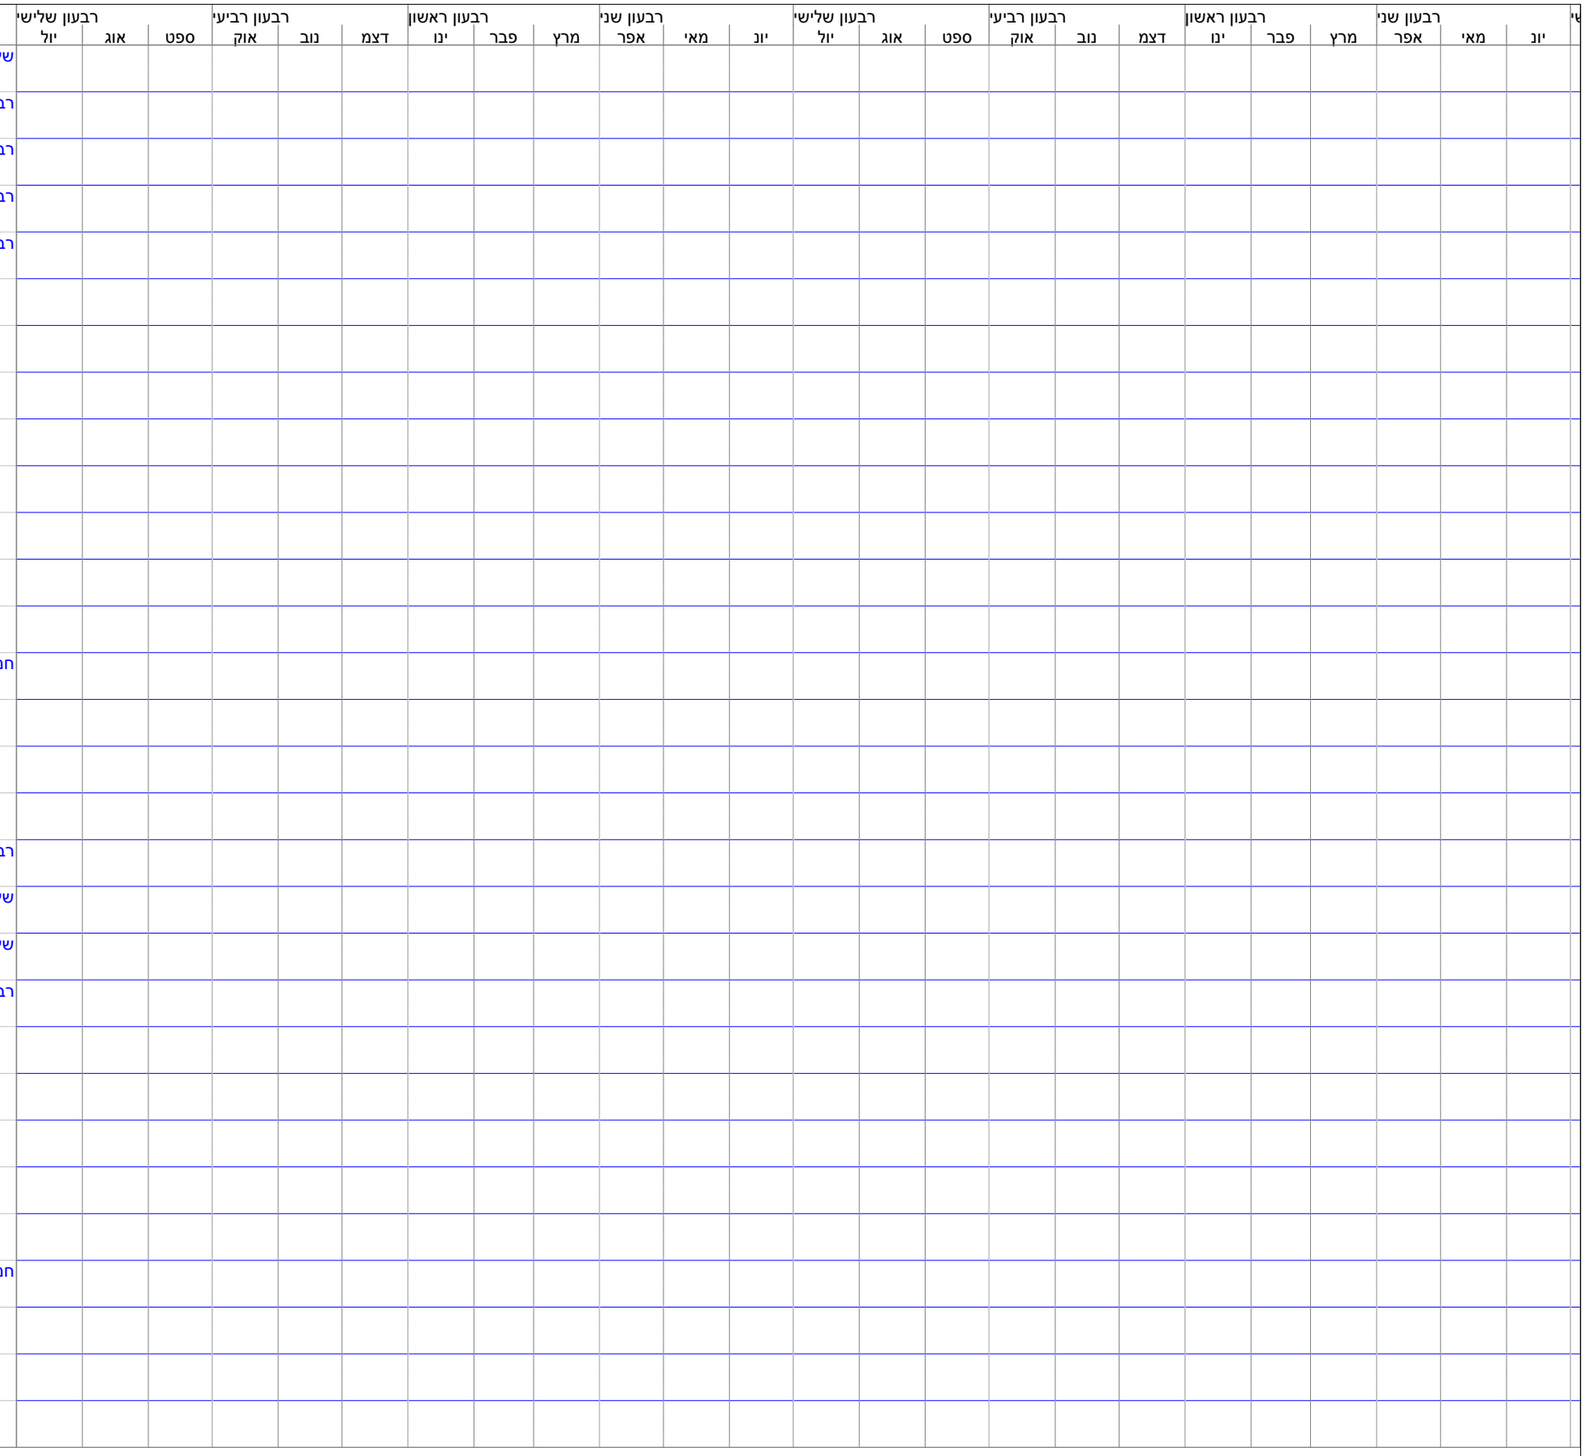

פרוייקט: לוז מארקדי אקורד 14.5.17
תאריך: שני 22/05/17

פעילות		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט		משך-בלבד		פעילויות חיצוניות					
פעילות קריטית		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל		סיכום ערסל ידני		אבן דרך חיצונית					
אבן דרך		התקדמות מסתכמת		אבן דרך לא פעילה		ערסל ידני		התקדמות					
ערסל		פיצול		ערסל לא פעיל		התחלה-בלבד		תאריך יעד					
פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות		פעילות ידנית		סיום-בלבד							

מזהה	שם פעילות	פעילויות קדם	משך	התחלה	סיום
101	.עבודות בטון - קירות ועמודים	99,100	Й99,100	Й99,100	Й99,100
102	עבודות איטום		14 days	ראש' 14/05/17	רבי' 31/05/17
103	קירות חוץ	101			
104	חדרים רטובים	103			
105	נגרות ומסגרות פלדה		8 days?	רבי' 15/02/17	ראש' 26/02/17
109	מתקני תברואה וגזים רפואיים		16 days	רבי' 24/05/17	רבי' 14/06/17
113	מתקני חשמל		80 days	שלש' 25/04/17	שני 14/08/17
121	עבודות טייח		10 days	שלש' 20/06/17	שני 03/07/17
122	תיקוני טייח		10 days	שלש' 20/06/17	שני 03/07/17
123	עבודות ריצוף וחיפויים		61 days	שלש' 30/05/17	שלש' 22/08/17
124	עבודות ריצוף	104			
125	עבודות חיפוי	145			
126	עבודות אלומיניום				
127	הזמנה דלתות				
128	אספקה והרכבה				
129	עבודות אבן				
132	מתקני מיזוג אויר				
139	עבודות ריצוף וחיפויים				
144	אלמנטים מתועשים בבנייה		46 days	ראש' 25/06/17	ראש' 27/08/17
147	מערכות ספרינקלרים והידרנטים		2 days		
151	מערכת כריזה				
153					
154					

פרוייקט: לוז מארקדי אקורד 14.5.17
תאריך: שני 22/05/17

פעילות		פעילות קריטית מסתכמת		ערסל פרוייקט		משך-בלבד		פעילויות חיצוניות	
פעילות קריטית		אבן דרך מסתכמת		קבץ לפי ערסל		סיכום ערסל ידני		אבן דרך חיצונית	
אבן דרך		התקדמות מסתכמת		אבן דרך לא פעילה		ערסל ידני		התקדמות	
ערסל		פיצול		ערסל לא פעיל		התחלה-בלבד		תאריך יעד	
פעילות מסתכמת		פעילויות חיצוניות		פעילות ידנית		סיום-בלבד			
